COMUNE DI OLBIA

Provincia di Sassari

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE NELLA FRAZIONE DI SAN PANTALEO

PROGETTO ESECUTIVO

Il sindaco:
Dott. Settimo Nizzi

Il dirigente del settore Tecnico:
Ing. Diego Ciceri

Il R.U.P.:
Geom. Graziella Orrù

Progettisti in R.T.P.:
Arch. Lorenzo G. Soro (Mandatario)
Altri componenti RTP
Arch. Andrea Pirastru
Arch. Giulia Sanna

Il committente:
Comune di Olbia

Oggetto:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DIAGRAMMA DI GANTT
(Analitico e grafico)

Tavola	Scala	Data	Revisione
PSC.03		**21.12.2023**	**001**

ALLEGATO "A"

Comune di Olbia
Provincia di SS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di un tratto di marciapiede e di una passerella pedonale

COMMITTENTE: Comune di Olbia - Settore Tecnico.

CANTIERE: Via Zara - Frazione san Pantaleo, Olbia (SS)

Olbia, 20/12/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Architetto Pirastru Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(Dirigente Settore Tecnico Ciceri Diego)

Architetto Pirastru Andrea
via del Giglio 14-6
07026 Olbia (SS)
Tel.: 3939795338 - Fax: _____
E-Mail: andreapirastru@hotmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree di cantiere						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	3	2	1	1	04/03/2024	04/03/2024
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	1	2	2	05/03/2024	06/03/2024
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	2	2	2	07/03/2024	08/03/2024
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	1	1	1	11/03/2024	11/03/2024
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	1	1	1	11/03/2024	11/03/2024
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3	1	1	1	12/03/2024	12/03/2024
	5	1	1	1	03/06/2024	03/06/2024
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3	1	1	1	13/03/2024	13/03/2024
	5	1	1	1	04/06/2024	04/06/2024
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2	1	1	1	14/03/2024	14/03/2024
Scavo di sbancamento	2	2	14	21	15/03/2024	04/04/2024
	5	2	2	2	05/06/2024	06/06/2024
Opere d'arte						
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	3	1	6	8	05/04/2024	12/04/2024
	5	1	2	4	07/06/2024	10/06/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	2	1	4	6	12/04/2024	17/04/2024
	5	1	2	2	11/06/2024	12/06/2024
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	2	1	4	4	16/04/2024	19/04/2024
	5	1	2	2	13/06/2024	14/06/2024
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5	1	8	10	17/06/2024	26/06/2024
Realizzazione di marciapiedi	5	1	10	14	27/06/2024	10/07/2024
Montaggio di parapetto metallico	5	E	5	7	11/07/2024	17/07/2024
Passerella in legno lamellare						
Montaggio travi in legno lamellare	4	3	3	3	22/04/2024	24/04/2024
Montaggio di grossa orditura di impalcato in legno lamellare	4	3	6	10	24/04/2024	03/05/2024
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	4	3	5	7	03/05/2024	09/05/2024
Montaggio di pavimentazione in tavolame di Iroko	4	3	9	13	09/05/2024	21/05/2024
Montaggio di parapetto metallico	4	1	3	3	22/05/2024	24/05/2024
Impianti a rete (illuminazione telecomunicazioni)						
Realizzazione di impianto elettrico per alimentazione corpi illuminanti	4	E	4	4	27/05/2024	30/05/2024
	5	E	5	5	10/06/2024	14/06/2024
	5	E	4	4	16/07/2024	19/07/2024
Posa di conduttura elettrica	5	E	4	4	22/07/2024	25/07/2024
Posa di conduttura telefonica	5	E	1	1	26/07/2024	26/07/2024
Montaggio di apparecchi illuminanti	4	1	2	4	31/05/2024	03/06/2024
	1	1	2	2	29/07/2024	30/07/2024
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	31/07/2024	31/07/2024

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = TRATTO 2 PARTE BASSA

3) = TRATTO 2 ZONA UNICA

4) = TRATTO 2 CARREGGIATA

5) = TRATTO 4A

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = APPALTATORE

2) = DITTA SCAVI

3) = STRUTTURE IN LAMELLARE

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
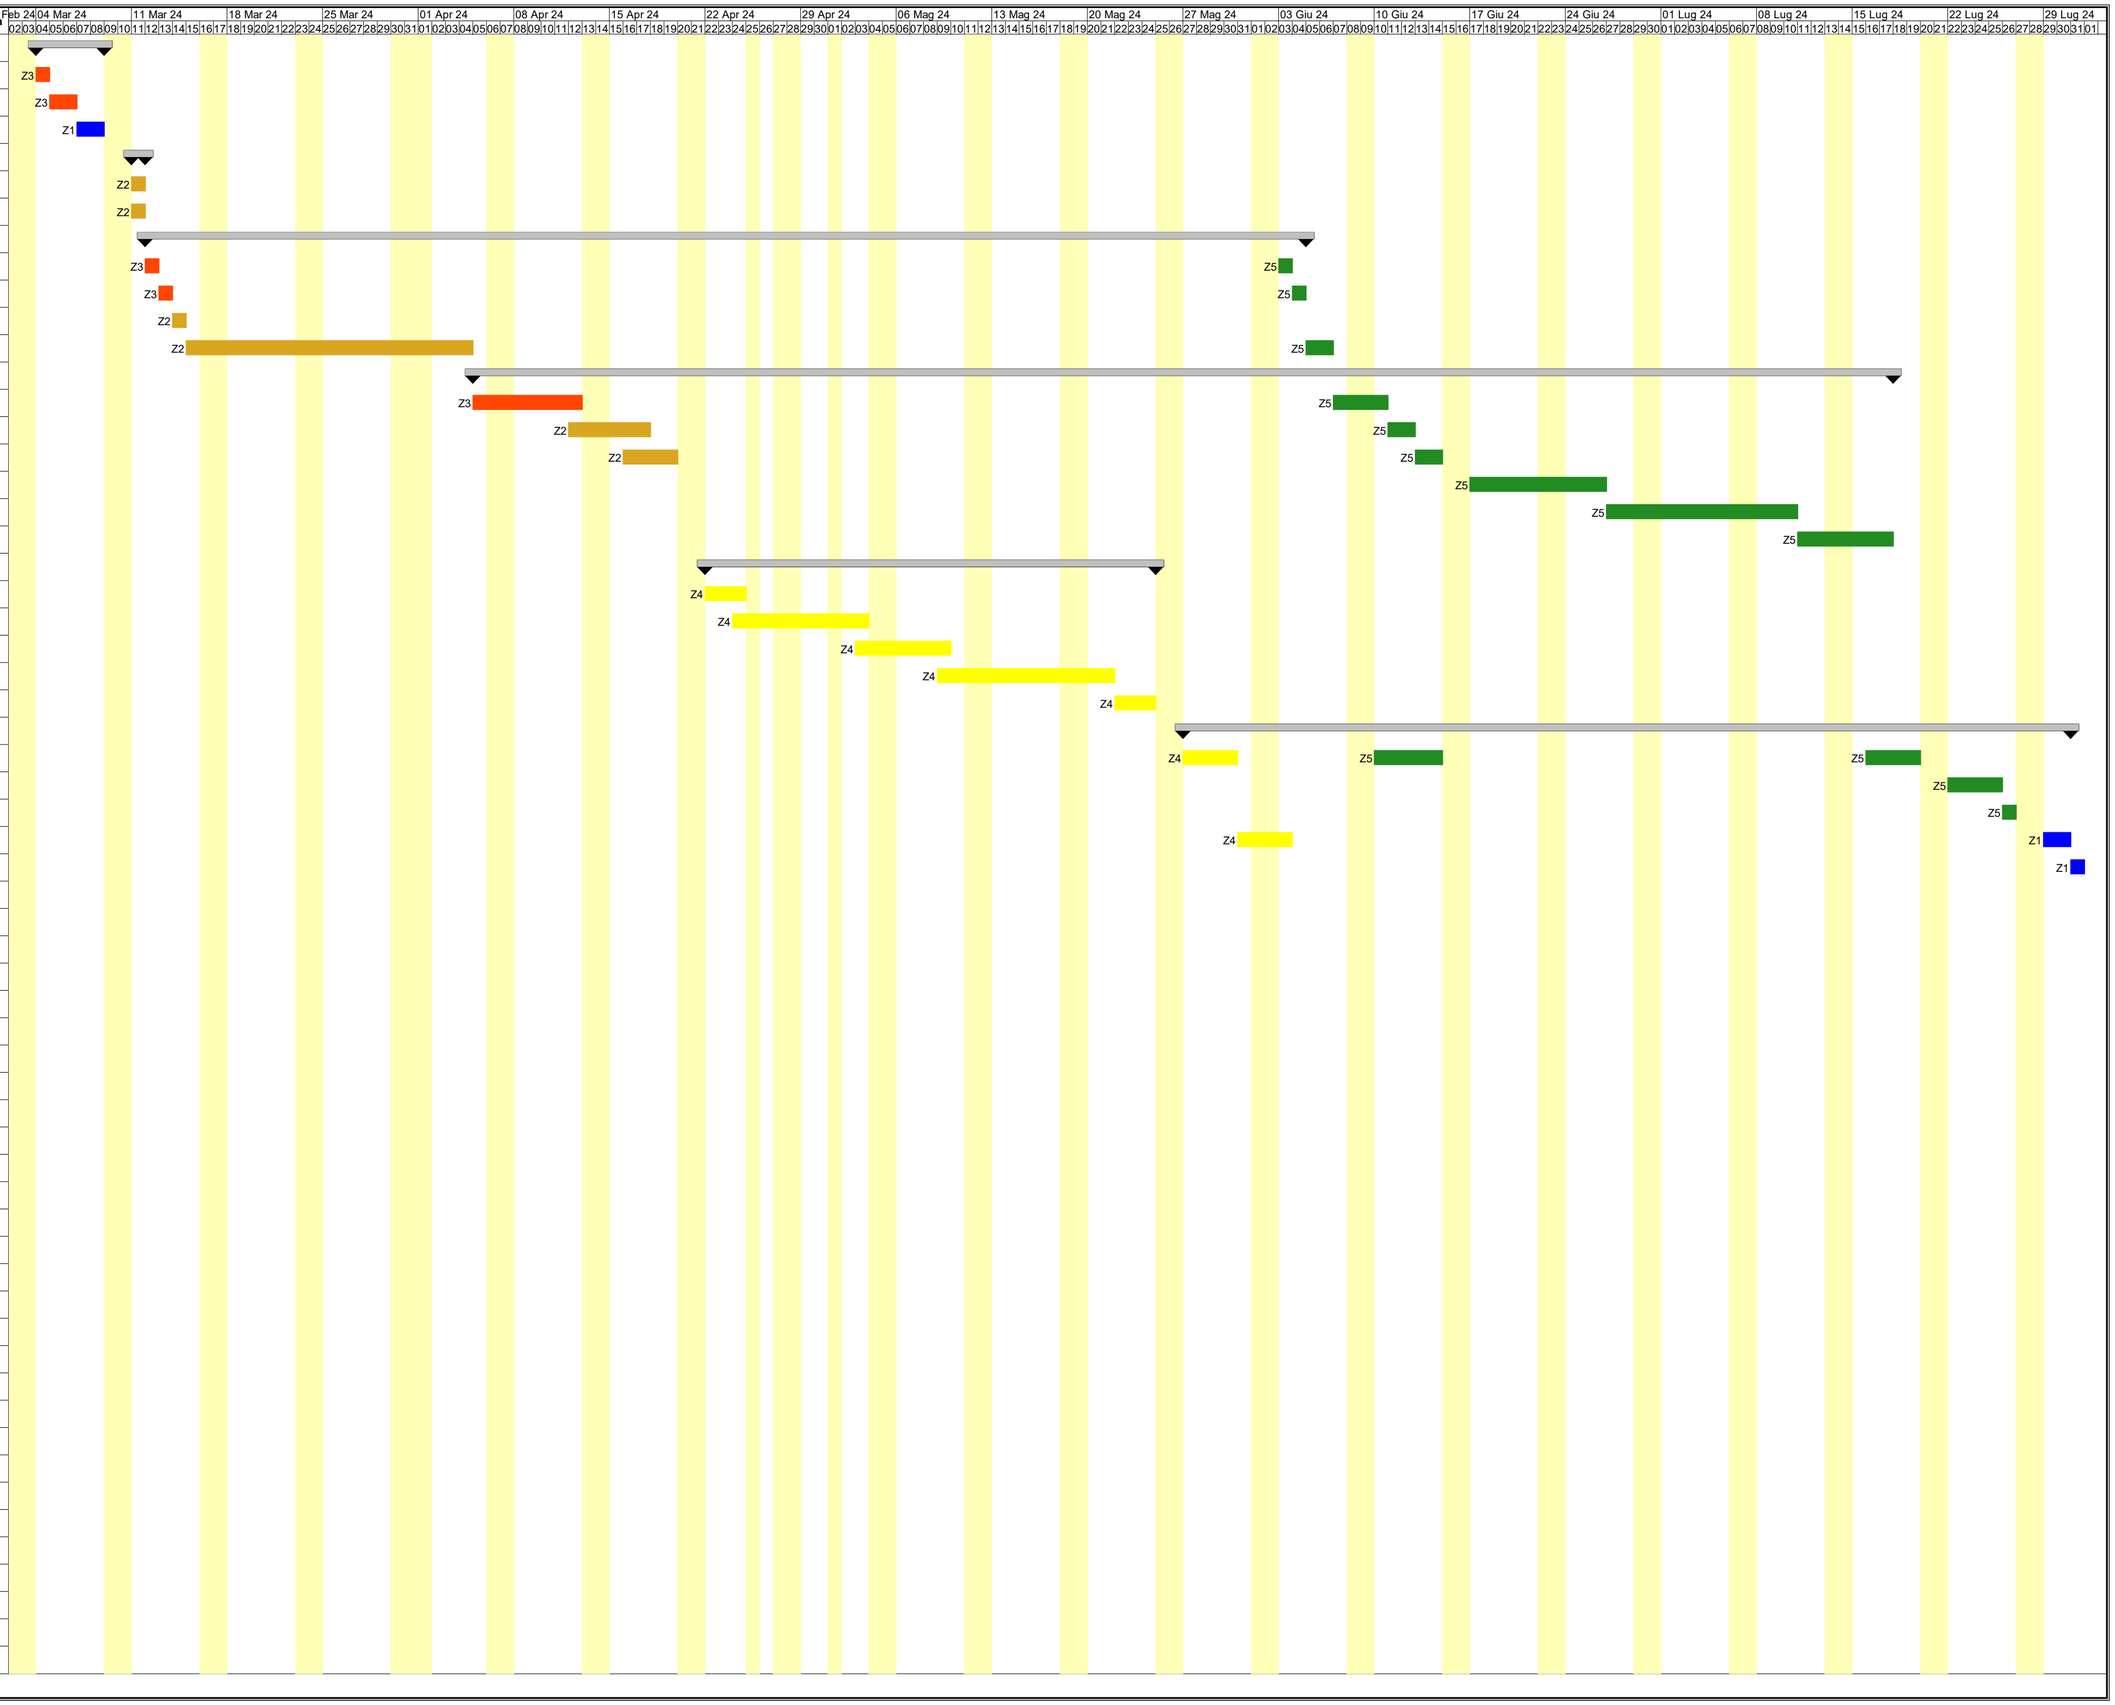
Nome attività	Durata
Preparazione delle aree di cantiere	5 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Realizzazione della viabilità di cantiere	2 g
Apprestamenti del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Impianti di servizio del cantiere	58 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
Scavo di sbancamento	16 g
Opere d'arte	72 g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad	8 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori s	6 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	6 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	8 g
Realizzazione di marciapiedi	10 g
Montaggio di parapetto metallico	5 g
Passerella in legno lamellare	23 g
Montaggio travi in legno lamellare	3 g
Montaggio di grossa orditura di impalcato in legno lamellare	6 g
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	5 g
Montaggio di pavimentazione in tavolame di Iroko	9 g
Montaggio di parapetto metallico	3 g
Impianti a rete (illuminazione telecomunicazioni)	47 g
Realizzazione di impianto elettrico per alimentazione corpi illu	13 g
Posa di conduttura elettrica	4 g
Posa di conduttura telefonica	1 g
Montaggio di apparecchi illuminanti	4 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	
Z2 = TRATTO 2 PARTE BASSA	
Z3 = TRATTO 2 ZONA UNICA	
Z4 = TRATTO 2 CARREGGIATA	
Z5 = TRATTO 4A
